



TILLEGGSINNKALLING

Dato: 09.01.2026

Utvalg for samarbeid

Tirsdag **13.01.2026 kl. 18:00**

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte **13.01.2026 kl. 18:00 i Formannskapssalen**. Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 917 45 011 eller epost tone.halvorsen@baerum.kommune.no

SAKSLISTE

Saksnr	Sakstittel	
PS-006/26	Konseptutredning og anbefaling av utvidelse - Hunsund ungdomsskole	

Eventuelt

Helene Berge Holm
Utvalgsleder

Tone Halvorsen
Utvalgssekretær



Dato:	Arkivkode:	Bilag nr:	Arkivsak ID:	J.post ID:
09.01.2026			25/15686	26/3193
Saksansvarlig:	Julija Jurin			
Saksbehandler:	Jørgen Molvig			

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Utvalg for samarbeid	13.01.2026	006/26
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning		
Hovedutvalg for klima, miljø og utvikling		
Formannskapet		
Kommunestyret		

Konseptutredning og anbefaling av utvidelse - Hundsund ungdomsskole

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Utredningen om muligheter for utvidelse av Hundsund ungdomsskole tas til orientering.
2. Hundsund ungdomsskole utvides ved at Hundsund barnehages arealer tilpasses skoleformål innenfor rammer vedtatt i BØP 2026 – 2029 Hundsund skole, Ombygging.
3. Tilpasning av barnehagearealet til skoleformål iverksettes 01.08.2026 og Hundsund barnehage avvikles fra samme dato.

Saken i korte trekk

Kommunestyret (KST) vedtok i [Skolebehovsanalyse 2024-2043, endelig behandling](#) sak 056/25, 27.05.2025, å ikke legge ned Hundsund barnehage ved utgangen av barnehageåret 2025/2026. Kommunedirektørens (KD)s opprinnelige forslag i skolebehovsanalysen var å fristille og tilpasse arealene i Hundsund barnehage til å dekke det økte kapasitetsbehovet ved Hundsund ungdomsskole til skoleåret 2027/2028, etter vedtak om å forskyve Tårnkvartalet ut i tid.

Som en del av behandlingen av Skolebehovsanalysen 2024-2043 vedtok KST følgende:

Kommunedirektøren bes gjennomføre en konseptvurdering/skisseprosjekt (F1 iht. Kommunens prosjektveiviser) for å avklare om Hundsund ungdomsskole kan bygges på i høyden (påbygg) og/eller bredden (tilbygg) for å imøtekomme økende elevantall. Konseptvurderingen skal:

- Avklare om skolebygget er konstruktivt egnet for et påbygg forutsatt at det benyttes et byggekonsept som reduserer behovet for tilpasninger av eksisterende bærekonstruksjoner og som har kort byggetid. For identifiserte behov for tilpasninger skal det foreslås tiltak.
- Identifisere muligheter og begrensninger for skoledrift med en påbygget etasje på eksisterende skolebygg og eventuelt tilbygg, i kombinasjon med nødvendige romtilpasninger i eksisterende bygg slik at Hundsund ungdomsskole kan imøtekomme et elevbehov på minst 24 klasser. For identifiserte begrensninger skal det foreslås tiltak.
- Inkludere et kostnadsestimat og estimert byggetid for en løsning basert på ovenstående. Saken fremlegges innen utløpet av 3. kvartal, eller så raskt som mulig etter dette.

Tidligere politisk behandling

- [Skolebehovsanalysen 2024.2043, endelig behandling](#), KST sak 056/25, 27.05.2025.
- [Skolebehovsanalysen – svar på spørsmål fra Dag Egil Strømme \(H\) om Hundsund skole](#), ref. KST møte 27.05.25, DokumentID: 2025/89657
- [Svar på spørsmål fra representanten Anders Puntervold Hammer \(H\) vedrørende påbygging av areal](#), Referatsaker 040/25, Hovedutvalg for oppvekst og utdanning, 13.05.2025.
- [Svar på spørsmål vedrørende paviljonger ved Hundsund, Anders Puntervold Hammer \(H\)](#), Referatsaker 032/24, Hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT), 08.04.2025.
- [Kommuneplanens handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025-2028](#), KST sak 134/24, 18.12.2024
- [Kommuneplanens handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2025-2028 – tilleggsinnstilling](#), KST sak 135/24, 18.12.24.
- [Utsettelse av Tårnkvartalet](#), KST 131/24, 18.12.2024
- Kommunedirektørens svar på spørsmål relevant for denne saken, ref. [politiske spørsmål og svar som del av politisk behandling av Kommunedirektørens forslag til kommuneplanenes Handlingsdel, Budsjett- og økonomiplan 2025-2028](#):
 - Spørsmål fra Anders Puntervold Hammer (H) om Hundsund/Fornebu/Lysker – skolekapasitet og muligheter, ID 2025-336.
 - Spørsmål fra Elisabeth Fremstad Aukrust (KrF) om Hundsund skole og barnehage, ID 2025-320.
 - Spørsmål fra Dag Vangsnes (FrP) om Kapasitet på Hundsund ungdomsskole, ID 2025-121.

- Spørsmål fra Dag Vangsnes (FrP) om Barnehager Bærum øst og Fornebu, ID 2025-120.
- Spørsmål fra Dag Vangsnes (FrP) om Barnehage og skolesituasjonen på Fornebu, ID 2025-284.

Alternativer for en utvidelse av Hundsund ungdomsskole

Kommunedirektøren har etablert en rådgivergruppe for å vurdere mulighetene for utvidelse av Hundsund skole. Gruppen består av en bygg ingeniør og en brannrådgiver fra Rambøll Norge AS, som tidligere hadde ansvar for prosjekteringen av Hundsund ungdomsskole, samt arkitekter fra div.A arkitekter AS, som opprinnelig utformet Hundsund grendesenter. Arbeidet har resultert i tre alternative løsninger for utvidelse av skolen:

- Ett alternativ for påbygg
- To alternativer for tilbygg

Det er lagt til grunn et samlet arealbehov på minimum 1 700 kvadratmeter. Dette omfatter:

- To nye klasserom for å gjøre skolen til en velfungerende seks-parallell
- Seks nye klasserom for å utvide fra seks-parallell til åtte-parallell, med tilhørende arealer for å sikre god skoledrift
- Ett spesialfagrom for å oppfylle krav til antall spesialrom for en åtte-parallell

I tillegg vil det være nødvendig å bygge om deler av eksisterende skolebygg for å tilfredsstille kravene til en åtte-parallell skole. Dette inkluderer blant annet ombygging av skolerestauranten til et spesialfagrom.

Med disse tiltakene økes elevkapasiteten fra 480 til 720 elever.

Alternativ 1 – Påbygg over en full etasje

Bruttoareal	Ca. 2255 m²	
Kostnadsestimat inkl. mva.	Ca. 224 mill. kr	
Byggetid	Ca. 1 år	
Estimert ferdigstillelse	Q4/28	
Skoledrift under bygging	Nei	
MUA uten fotballbane	Ca. 14,5 m²/elev	
MUA inkludert liten fotballbane	Ca. 24,2 m²/elev	



Det ble vurdert flere løsninger for et påbygg. Dersom den nye etasjen skulle være mindre enn etasjen under, ville det oppstå snøansamling mot den nye etasjen. En slik snøfonn gir store laster, og bæresystemet under måtte forsterkes. Det ble derfor vurdert som mest hensiktsmessig å bygge på hele flaten, med unntak av en mindre utkraget del av konstruksjonen.

Store deler av bæresystemet tåler lasten fra en ekstra etasje, men enkelte elementer må forsterkes:


- To stålsøyler og sju utvekslingsbjelker
- Ekstra avstiving med to nye vindkryss
- Forsterkning av randsonen til hulldekkene i 2. etasje

Det er også usikkerhet knyttet til samvirkebjelker og opptak av horisontale laster i fundamentene. Kostnadskalkylen inkluderer forsterkning av alle samvirkebjelker, mens fundamentene er antatt å tåle ekstra last.

Skolen har et skrått takvindu langs hele bygget. Overlyset må videreføres i nytt tak for å oppfylle dagslyskravet i etasjen under. Dette reduserer fleksibiliteten i planløsningen. Nivåforskjellen på om lag én meter må bygges opp ved omgjøring av taket til etasjedekke, noe som vurderes som lite gunstig.


Et påbygg vil kreve omfattende ombygging av eksisterende konstruksjon nedover i etasjene og gjør det umulig å opprettholde skoledrift under byggeperioden. Dersom utvidelsen vedtas i første kvartal 2026, er det estimert at bygget kan tas i bruk i januar 2029. Selve byggingen vil vare i om lag ett år.

Alternativ 2 – Toetasjes tilbygg

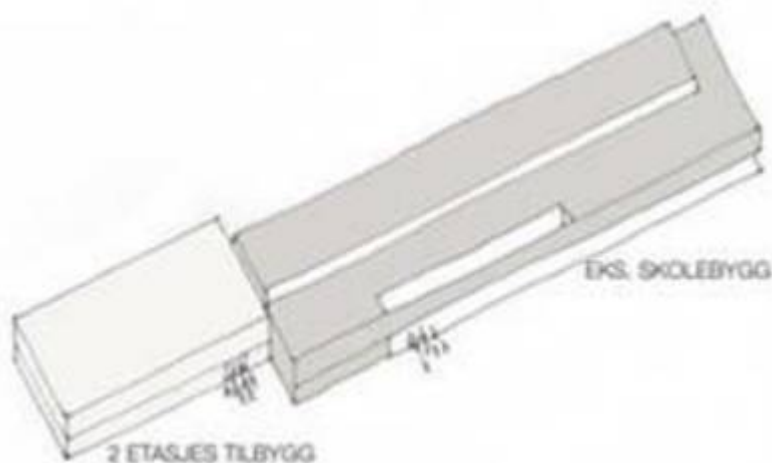

Bruttoareal	Ca. 1935 m²
Kostnadsestimat inkl. mva.	Ca. 191 mill. kr
Byggetid	Ca. 1 år
Estimert ferdigstillelse	Q4/28
Skoledrift under bygging	Ja
MUA uten fotballbane	Ca. 13,1 m²/elev
MUA inkludert liten fotballbane	Ca. 22,8 m²/elev

Alternativ 3 – Treetasjes tilbygg

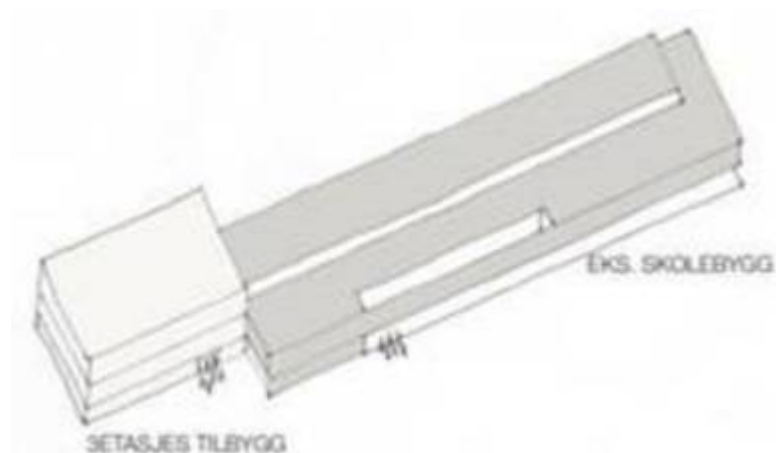

Bruttoareal	Ca. 2225 m²
Kostnadsestimat inkl. mva.	Ca. 222 mill. kr
Byggetid	Ca. 1 år
Estimert ferdigstillelse	Q4/28
Skoledrift under bygging	Ja
MUA uten fotballbane	Ca. 13,4 m²/elev
MUA inkludert liten fotballbane	Ca. 23,2 m²/elev

Begge tilbyggsalternativene er plassert på den nordøstlige kortsiden av det eksisterende skolebygget. Denne plasseringen sikrer at tilbygget verken reduserer dagslys i eksisterende klasserom eller beslaglegger opparbeidet uteareal. Arkitekten vurderer også at løsningen styrker «grendegaten» som et sentralt element i skolemiljøet.



Et tilbygg over tre etasjer vil medføre snøansamling mot eksisterende bygg, noe som krever forsterkning av bæresystemet under snøfonnen. I tillegg vil et treetasjes tilbygg kreve en ekstra heis, mens et toetasjes tilbygg kan benytte eksisterende heis.

Det vil være mulig å gjennomføre byggingen av et tilbygg samtidig som skolen er i drift, med enkelte tilpasninger. Dersom utvidelsen vedtas i første kvartal 2026, er det estimert at tilbygget kan tas i bruk i januar 2029. Selve byggeperioden er beregnet til om lag ett år.

Regulering

Det er opprettet en regulerings sak for en mulig utvidelse av Hundsund ungdomsskole. Kommunens administrasjon har gitt sine uttalelser til saken, og reguleringsmyndighetene har på bakgrunn av dette gitt anbefalinger for det videre arbeidet. Planinitiativet vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel, og området er allerede regulert til offentlig tjenesteyting.

Dersom det ikke fremkommer vesentlige innvendinger i en eventuell høringsrunde, ligger forholdene til rette for at planendringen kan behandles etter en forenklet prosess. Dette

innebærer nabovarsling, inkludert varsling til statsforvalter og fylkeskommune, samt forberedelse av en politisk sak. Det antas at prosessen vil ta om lag 4–5 måneder.

En utvidelse av skolen vil imidlertid berøre enkelte reguleringsbestemmelser, og det er mottatt faguttalelser som må vektlegges i en eventuell plansak:

- Ved et påbygg med en ekstra etasje eller et tilbygg over tre etasjer vil bygget overskride høydebestemmelsene i gjeldende reguleringsplan (kote +15, [vist i arealplankartet](#)).
- Tilbygget er plassert på felt 2, som i henhold til [bestemmelsene](#) skal være ubebygd.



- Park, landbruk, natur og kulturvern (PLNK) påpeker at det finnes trær på felt 2 som illustrasjonsplanen viser skal bevares. Det er også identifisert overvannsproblematikk som må løses ved utbygging på felt 2.

Minste uteoppholdsareal (MUA)

For alle alternativer vil uteoppholdsarealet per elev bli lavere enn kravet dersom skolen utvides fra 480 til 720 elever. [Bærum kommuneplanens arealdel 2022–2042](#) angir et minimumskrav på 18–24 kvadratmeter per elev. For alternativ 1, 2 og 3 vil MUA være om lag 14,5, 13,1 og 13,4 kvadratmeter per elev.

Kommuneplanen åpner for å innlemme tilleggsareal som ligger i direkte tilknytning til tomten. På Hundsund finnes en stor og en liten fotballbane. Den store banen driftes av Snarøya sportsklubb og kan ikke benyttes fritt av elevene, mens den lille banen kan innlemmes. Dette vil gi tilstrekkelig uteoppholdsareal for alle alternativer, om lag 23–24 kvadratmeter per elev.

Grunnskoleavdelingen uttrykker bekymring for om utearealene gir tilstrekkelig variasjon, og om tilleggsarealene vil fungere i praksis. Uteområdene benyttes også av Snarøya skole i storefri og i SFO-tiden, og «grendegaten» fungerer som turvei for lokalbefolkningen samt adkomst til barnehagen.

Folkehelsekontoret peker på utfordringer knyttet til uteoppholdsarealet og mener at en ombygging av barnehagen til ungdomsskolearealer vil være den beste løsningen for elevene. De presiserer at folkehelsekontoret skal samtykke til planene og godkjenne skolen før oppstart.

Økonomi

En ekstern tredjepart har utarbeidet kostnadskalkyler for de tre alternativene for utvidelse av Hundsund skole vist ovenfor. Kalkylene bygger på arkitektens planskisser, den branntekniske vurderingen, vurderingen av det eksisterende bæresystemet og tilgjengelige grunnundersøkelser fra 2004.

Alternativ	Bruttoareal	Kostnadsestimat inkl. mva.	Byggetid	Estimert ferdigstillelse	Skoledrift under bygging
Påbygg (full etasje)	ca. 2 255 m ²	ca. 224 mill.	ca. 1 år	Q4/2028	Nei
Tilbygg (to etasjer)	ca. 1 935 m ²	ca. 191 mill.	ca. 1 år	Q4/2028	Ja
Tilbygg (tre etasjer)	ca. 2 225 m ²	ca. 222 mill.	ca. 1 år	Q4/2028	Ja

Kostnadsestimat er basert på prisnivå pr. august 2025 og inkluderer arbeid fra og med beslutningspunkt 2 (BP2) til og med beslutningspunkt 5 (BP5), samt kostnader knyttet til ombygging av eksisterende skolebygg. Det er fortsatt usikkerheter knyttet til prosjektet, og disse er hensyntatt i kalkylene.

Detaljerte kostnadsestimat for hvert alternativ er presentert i foregående kapittel.

Det presiseres at det i gjeldende budsjett og økonomiplan (BØP) for perioden 2026–2029 ikke er avsatt tilstrekkelige midler til å gjennomføre påbygg- eller tilbyggsalternativene som omtales i denne saken. Eventuell realisering forutsetter derfor politisk behandling av finansiering i kommende budsjettprosesser.

Vurdering av skoledrift parallelt med kapasitetsutvidelse

Kommunedirektøren vurderer at det vil være mulig å gjennomføre bygging av et tilbygg samtidig som skolen er i normal drift. Dette vil imidlertid medføre utfordringer knyttet til støv og støy, og prosjektet må ha særskilt fokus på sikkerhet for elever og ansatte.

Grendesenteret har flere innfartsårer, noe som gjør det mulig å opprettholde tilgjengelighet til skolen, barnehagen, svømmehallen og idrettshallen selv med avsperrede riggområder.

Ved et påbygg på taket vil det derimot ikke være mulig å opprettholde skoledriften under byggeperioden.

Avlastningskapasitet

Det finnes ingen tilgjengelig [avlastningsskole](#) dersom det blir behov for å flytte elever under en eventuell utbygging. Bærums Verk avlastningsskole er først planlagt for elever fra Bryn skole fra vinteren 2027, og deretter for elever fra Gjettum skole. Avlastningsskolen vil derfor ikke være tilgjengelig for Hundsund før tidligst etter 2031/2032. I tillegg er kapasiteten ved Bærums Verk begrenset til 15 klasser, noe som er for lite til å dekke Hundsund skoles behov på 17 klasser.

Vurdering av alternativene for utvidelse

I denne saken er det utredet tre hovedalternativer for kapasitetsutvidelse ved Hundsund ungdomsskole:

- Påbygg av en ekstra etasje på eksisterende skolebygg
- Tilbygg over to etasjer
- Tilbygg over tre etasjer

Av disse fremstår tilbygget over to etasjer som det mest hensiktsmessige ut fra en samlet vurdering av kostnader, arealbruk og gjennomførbarhet. Dette alternativet er det rimeligste, gir effektiv arealutnyttelse, krever ingen forsterkning av eksisterende konstruksjon og gjør det mulig å opprettholde skoledrift under byggeperioden. Det legger press på minst uteoppholdsareal per elev, men med mulig innlemmelse av den lille fotballbanen vil det teoretiske arealkravet kunne oppfylles.

I tillegg til disse alternativene har kommunedirektøren tidligere foreslått å utvide ungdomsskolen ved å omdisponere barnehagelokalene til skoleformål. Dette alternativet sikrer nødvendig ungdomsskolekapasitet, kan gjennomføres før kapasiteten overstiger behovet, og vurderes som økonomisk forsvarlig innenfor dagens investeringsrammer og økonomiske situasjon.

Kommunedirektøren har, i tråd med kommunestyrets bestilling, utredet tre alternative løsninger for kapasitetsutvidelse ved Hundsund ungdomsskole: påbygg, tilbygg over to etasjer og tilbygg over tre etasjer. Disse alternativene er vurdert opp mot hverandre, og det er gjort rede for fordeler og ulemper ved hver løsning.

På bakgrunn av tidligere vurderinger og gjeldende økonomiske rammer, opprettholder kommunedirektøren sin anbefaling om å omdisponere barnehagelokalene til skoleformål. Dette alternativet vurderes fortsatt som den mest hensiktsmessige løsningen for å sikre nødvendig ungdomsskolekapasitet innenfor et forsvarlig tidsperspektiv og med lavest mulig investerings- og driftsbehov.

Det er viktig å unngå å bygge flere kvadratmeter enn det reelle behovet tilsier. Kommunen har allerede et betydelig antall kvadratmeter som ikke er i bruk i dag. Et tilbygg eller påbygg vil kunne medføre økte fremtidige driftskostnader dersom det bygges mer enn det som er nødvendig på kort og mellomlang sikt.

Tentativ fremdriftsplan

Milepæler	Tidsangivelse
Konseptvurdering for påbygg og/eller tilbygg på Hundsund skole for å øke kapasiteten på skolen fra seks til åtte paralleller. (Dette saksfremlegg)	Januar 2026
Forslag revidert konsept og igangsettelse av planleggingsfasen (BP2)	Q3 - 2026
Gjennomføring av endring av reguleringsplanen	Q1/26 - Q3/26
Fremlegge forslag til prosjektets ramme (BP3)	Q2 - 2027
Prosjektering	Q2/27 - Q4/27
Bygging	Q1/28 - Q4/28
Tjenesten tar bygget i bruk (BP4)	Januar 2029
Prøvedrift	Q4/28-Q4/29
Sluttrapport (BP5)	Q1 - 2030

Fremtidig totalkapasitet for ungdomstrinnet på Fornebu

[Skolebehovsanalysen 2024–2043](#) viser at det samlede behovet for ungdomsskolekapasitet på Fornebu vil være om lag 13–14 paralleller. En utvidelse av Hundsund skole alene vil ikke være tilstrekkelig for å dekke det fremtidige behovet fra de fire barneskolene i området, samt etter hvert også Holtekilen barneskole. Det vil derfor på sikt være nødvendig å etablere ytterligere ungdomsskolekapasitet ved Tårnkvartalet.

Kommunaldirektørens inngang i saken er å skape gode barnehage- og skoletilbud, utnytte allerede eksisterende barnehagekapasitet på Fornebu i stedet for å bygge mer, samt fremme et forslag som ivaretar økonomisk forsvarlighet. En eventuell utvidelse av Hundsund skole – enten som påbygg, tilbygg eller ved bruk av barnehagelokalene – må ses i sammenheng med det langsiktige behovet for ungdomsskole plasser på Fornebu og hvordan dette påvirker planene for Tårnkvartalet.

Dersom det på et senere tidspunkt blir behov for å justere kapasiteten ved Tårnkvartalet, kan det være aktuelt å vurdere alternative løsninger, for eksempel å kombinere barne- og ungdomstrinn på samme tomt for å sikre god ressursutnyttelse og ivareta investeringsbehov knyttet til teknisk infrastruktur og flerbrukshall. Dette vil kunne påvirke disponeringen av utearealer og forutsette en ny vurdering av reguleringsplanen, hvor omfang og kvalitet på uteoppholdsarealer må vurderes i en tett bymessig kontekst.

Endelig valg av løsning forutsetter politisk behandling, og det er viktig at kapasiteten tilpasses det reelle behovet for å unngå unødvendige investeringer og fremtidige driftskostnader.

Kommunedirektørens samlede vurdering

Kommunen står overfor et økende behov for ungdomsskolekapasitet på Fornebu, samtidig som det skal sikres tilstrekkelig barnehageplasser og økonomisk forsvarlighet. Hundsund grendesenter har en eiendomsmasse med betydelig elastisitet, noe som gir kommunen mulighet til å tilpasse arealene etter skiftende behov. Denne fleksibiliteten er en styrke og gjør det mulig å møte kapasitetsutfordringer på en måte som ivaretar både kvalitet og økonomi.

I gjeldende budsjett og økonomiplan (BØP) for perioden 2026–2029 er det satt av 82,4 mill. til ombygging av Hundsund barnehage til skoleformål. Ved å benytte eksisterende arealer og tilpasse dem til ungdomsskoleformål, kan kommunen dekke det akutte kapasitetsbehovet på en kostnadseffektiv måte. Ved at tilpasning av barnehagearealet til skoleformål iverksettes fra 1. august 2026, vil Hundsund barnehage avvikles fra samme tidspunkt. Dette innebærer omgjøring av tidligere kommunestyrevedtak [056/25](#).

Barn som allerede går i barnehagen, vil bli ivaretatt i tråd med vedtektene for kommunale barnehager og gis prioritet i henhold til punkt 5 i [Vedtekter for kommunale barnehager i Bærum](#). Avviklingen vil berøre 67 barn, og overgang til ny barnehage vil skje i nært samarbeid mellom barnehage og hjem. Omstillingsprosesser knyttet til medarbeidere gjennomføres i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk, herunder arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Prosessen skal sikre medbestemmelse, involvering og tilstrekkelig informasjon til alle berørte parter. Hundsund barnehage har i dag 23 medarbeidere med fast ansettelse, og samtlige vil få tilbud om arbeid i en annen kommunal barnehage. Kommunedirektøren trekker inn erfaring fra tilsvarende prosesser for å sikre tett oppfølging, tydelig kommunikasjon og dialog med berørte parter. Godt planlagte omstillinger reduserer usikkerhet og bidrar til å opprettholde motivasjon og arbeidsmiljø.

Kommunedirektøren vurderer det nødvendig å sikre lokal ungdomsskolekapasitet som gir plass til alle elever fra barneskolene Lysaker, Oksenøya, Storøya og Snarøya ved overgang til 8. trinn. En ytterligere utsettelse av kapasitetsøkning vil kunne skape usikkerhet knyttet til skoletilbudet og påvirke rekruttering av lærere. Skolen er et nav for ungdommen i lokalmiljøet, og det er sentralt å videreutvikle et område i rask vekst, spesielt med tanke på aldersgruppen 13–16 år. Skolen skal være et naturlig samlingssted også etter skoletid, i regi av både miljøarbeidere og frivillig virksomhet.

Den strategiske beslutningen om å utsette Tårnkvartalet har allerede gitt kommunen en betydelig økonomisk gevinst, ved at en potensiell investeringsramme på nær 1,8 milliarder kroner er skjøvet ut i tid. Dette gir handlingsrom til å prioritere nødvendige tiltak og tilpasse investeringene til det faktiske behovet, uten å pådra seg unødvendige drifts- og kapitalkostnader. Det fremstår nødvendig å komme i gang med omdisponering av areal fra høsten 2026 for å unngå behov for alternative undervisningsløsninger ved andre lokasjoner for elevgrupper ved Hundsund ungdomsskole.

Kommunedirektøren legger til grunn at forsvarlig ressursutnyttelse, fleksibilitet i eiendomsforvaltningen og økonomisk ansvarlighet skal være styrende for videre planlegging og gjennomføring av kapasitetsutvidelsen ved Hundsund ungdomsskole.

Merknad om saksfrist

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at denne saken ikke er meldt opp innenfor ordinær saksfrist, jf. reglementsheftet § 2-2 «Møteinnkalling og saksliste». Årsaken til fristoversittelsen er at arbeidet med saken har vært omfattende, og det har ikke vært mulig å ferdigstille saksfremlegget innen fristen. I tråd med reglementet gis denne begrunnelsen i

saksfremlegget. Saken anses som så prinsipiell og viktig at den fremmes nå ved starten av 2026, til tross for avvik fra ordinær prosedyre.
